

OFFICIAL WEBSITE RENEWAL — PROPOSAL

公式Webサイト リニューアル 御提案書

900ページ超・8階層の情報をターゲット別・約100ページへ再設計。
WordPress移行とAIによる更新支援で、「自分たちで育て続けられる」本部サイトへ。

一般社団法人 日本産業カウンセラー協会 御中

本部サイト（<https://www.counselor.or.jp/>）の全面リニューアル——LPを含む全ページが対象です

提出日： 2026年7月6日（月）

提案元： 株式会社インフォネット

制作パートナー： 株式会社ITLINE

稼働目標： 2027年5月6日（木） 5月連休明け稼働

基盤： Xサーバー + WordPress（支部と統一）

基盤検証： 物販・会員ログインの実現性を検証

01 提案コンセプト

CONCEPT

「整理して、届けて、育て続ける。」——現行サイトの「探しにくい・更新しにくい・保守が限界」を根本から解消し、公開後も貴会自身で維持できるサイトをご提案します。柱は3つです。

1 情報を1/9へ整理

900ページ超・8階層を、目的別入口×4～5階層・約100ページへ。当社は既に現行サイト全ページを実査し、静的155ページ全件の移行判定台帳を作成済みです（別紙サイトマップ）。

2 資格取得者に届く導線

資格取得希望者（メイン）・会員・相談希望者・法人をターゲット別に整理。「探せない」を解消し、集客と収益貢献（目的(2)）につなげます。

3 WordPressに統一し内製化

支部サイトと基盤を統一（運用ノウハウ・コスト最適化）。職員が自力で編集でき、インフォCMSの高コスト・使いにくさを解消。ライセンス料¥0（OSS）の標準技術で拡張性も安心。

900P超→約100P

情報は捨てずに管理対象を1/9へ（350P選別済）

8→4～5階層

階層を整理し到達性・操作性を改善

2027.5.6 稼働

保守限界前の安全な移行スケジュール

構成① 提案の骨子 — 本書での該当ページ

提案コンセプト	P.1
協会要求事項への対応	P.4-5
活動概要・スコープ	P.3・6・7
実施体制・作業分担	P.9
スケジュール	P.9

構成② 必須項目と追加提案の切り分け

提案必須（協会要求事項）	P.4-5
追加提案（当社判断）	P.8
追加提案（AIによるHP更新支援）は費用を分離し、見積上限の除外対象として記載します。	

内数で最適

機能・ページ数・体制はすべて協会ご要求の範囲内（内数）で設計。過剰でも過少でもない最適解とし、上乘せの追加提案のみ分離・任意選択としています。

02 現状認識と課題（全ページ実査に基づく）

ISSUES

ご提案にあたり、当社で**現行サイトの全ページ構造調査を実施**しました（2026年7月）。「探しにくい」の原因は感覚ではなく、構造として特定できています。

実査で判明した現行サイトの実態

155

静的ページ（実測）
＋記事 約400～600件

19

ADR関連だけで19ページ
（手引きを16分割）

5層+

講座案内は実質5階層
超
（二重ネスト構造）

3系統

CMS外の静的サブサイ
ト
（シニア特設・eラー
ニング・こころのアド
バイザー）

① 複雑すぎる構造で到達できない

900ページ超・8階層。設計コンセプトが継承されず、運用ルールが無いまま作成だけを繰り返した結果、目的の情報に辿り着けない。特に**資格取得希望者向け情報が見つけない**。

② 運用ルール・体制の不在

各事業部門が**個別にメンテ業者へ依頼**し、デザインの統一性が無い。掲載・削除の基準が無く、役目を終えた特設・告知が現役ナビに残存。

③ システムが保守限界

現行基盤が保守限界を迎え**移行が必須**。2026年4月からプロジェクトが始動し、移行対象の選別が進行中（900→現在350ページまで）。

④ インフォCMSの高コスト・使いにくさ

ライセンス費用が高く使いにくい現行CMS。職員が自力で編集しづらく、**更新が特定業者依存**になっている。

⚠ 移行時に必ず守るべき資産：外部被リンクと検索評価

現行サイトは**URL規則が3種類混在**しており（実査で確認）、行政・関連団体からの被リンクも多数あります。ページを大幅削減する今回こそ、**旧URL全件→新URLの301リダイレクト設計が必須**です。当社は静的155件の全URL台帳を既に作成済みで、初日から移行設計に着手できます。

03 活動スコープと全体戦略

SCOPE & STRATEGY

活動スコープ — 「どこからどこまで」を明確化（境界を色で区別）

区分	✓ 当社が実施（スコープに含む）	対象外・別途（境界を明示）
対象サイト	本部サイト全体（LPを含む全ページ）・CMS外静的サブサイト3系統の統合	支部サイト13（移行済のため対象外・接続は維持）
工程	要件定義／設計／デザイン／WordPress構築／コンテンツ移行・301設計／検証・研修・公開／公開後の保守運用	取材・撮影（不要のご指定）／原稿の新規ライティング（未定・別途ご相談）
機能	部署別権限・承認フロー／掲載期限・アーカイブ自動化／サイト内検索／各種フォーム／物販・会員ログイン（基盤検証のうえ実装）	FAQ自動応答チャットボット等（追加提案にも含まない）
追加提案	AIによるHP更新支援（下書き・チェック・分析要約）＝ P.8。費用は見積書で必須費用と分離	－

全体戦略 — 4つの方針

① 情報の再設計

約100ページ・4～5階層へ。掲載期限つき運用で鮮度を維持。

② ターゲット別IA

資格取得者（主）・会員・相談・法人の目的別入口を最上位に。


③ WordPress内製化

Xサーバー＋WordPressへ移行。部署別権限で職員が自力更新。

④ AI更新支援（追加提案）

下書き・チェック・分析をAIが支援。少人数でも回る運用へ。

「900ページ超 → 約100ページ」の考え方（情報は捨てません）

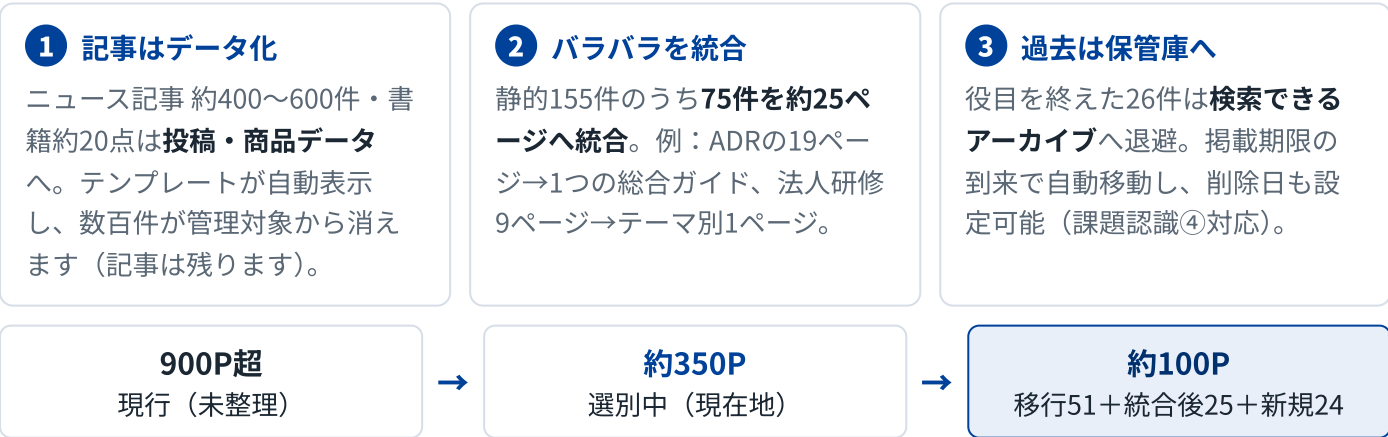

04 要求対応表① 課題認識・機能要求への対応

COMPLIANCE 1/2

RFP「協会の要求事項」の全項目に対応します（提案書構成②：提案必須の項目）。○＝本提案で充足。

協会のご要求	対応	当社の対応方針	該当
課題認識① 設計コンセプト未継承・運用ルール不明瞭	○	共通テンプレート＋スタイルガイド・設計資料一式を納品し継承可能に（対策①-1）。部署別権限・承認フロー・掲載期限の運用ルールを要件定義で明文化し、研修で定着（対策①-2）	P.6・P.7
課題認識② 900ページ超と膨大	○	全件を5分類台帳で精査し約100ページへ（基本構成検討384ページ→さらなる精査のご意向に対応）。類似ページは30グループ・75件を統合し情報の分散を防止（対策②-1/2）	P.3・別紙
課題認識③ 9階層で閲覧者が断念	○	4～5階層に制限（対策③-1）。ターゲット別入口・パンくず・ページ内アンカー・サイト内検索・関連リンクで「断念させない」導線を随所に設計（対策③-2）	P.6
課題認識④ 過去情報が放置	○	掲載期限＋削除日を記事単位で設定（対策④-1）。期限到来で検索可能なアーカイブへ自動移動→削除日に削除（対策④-2）。仕組みで放置を再発防止	P.3・P.7
機能要求① 基本方針 統一スタイル／トップとサブの役割／操作性・検索／主管部署明確化／自力作成／マルチデバイス	○	ページ設計の基本スタイルをスタイルガイドで統一。トップ＝入口特化・サブ＝内容、と役割を分離設計。キーワード検索＋絞込で行先案内。全ページに 主管部署タグ 。ブロックエディタで 主管部署が自力作成 。レスポンスでPC/スマホ/タブレット対応	P.6・P.7
機能要求② トップページ 組織トップのアピール可変／目的別の道先案内／コンセプト継承	○	ヒーロー・ピックアップ枠をCMSから差し替え可能にし「毎回同じで飽きる」を脱却。 ターゲット別ゲートウェイ で目的に呼応する道先案内。デザインガイドラインで構成コンセプトを継承	P.6
機能要求③ サブページ コンセプト統一／閲覧者を限定した案内／カテゴリ分類／過去記事の分別／ページ数削減	○	カテゴリ共通テンプレートで統一。 9カテゴリ×閲覧者別 に分類区分け。オンタイム記事と過去記事を分別し、過去分は検索可能な保管データへ。 約100ページ＝目標（200ページ以下）を大幅達成	P.6・別紙
機能要求④ 部単位・収益事業単位で閲覧者属性が違ふ	○	部・事業単位の閲覧者属性を前提に サブページのカテゴリを設計 （相談／資格・講座／試験／法人／会員／協会 ほか9カテゴリ）。全ページに主管部署を割当て、部署別の更新権限と紐づけ	P.6

別紙サイトマップには、現行155ページ全件の行き先（どのページがどこへ移行・統合されるか）を1件ずつ掲載しています。

05 要求対応表② 非機能要求・プロジェクト活動支援要求への対応

COMPLIANCE 2/2

協会のご要求	対応	当社の対応方針	該当
非機能要求① システム基盤 Xserver・WordPress最優先／欠点補完／実現不可なら基盤提案	○	支部と同じXserver+WordPressを第一候補とし協会全体最適を優先。欠点補完としてWAF設定・自動バックアップ・ステージング環境・脆弱性監視を標準装備。物販・会員限定ログインは要件定義で実現性を検証し、不足時はクラウド型サーバーの基盤提案（費用差異は事前提示）	P.7
非機能要求② 基盤運用 情シス2名で運用／実施すべき運用事項の提案／ランニング提案と費用見積	○	情シス2名で回る前提の運用設計（日常更新は主管部署へ分散）。実施すべき運用事項として月次更新・バックアップ・監視・障害対応・年次の脆弱性点検を提案。ランニングの内容と費用は別紙見積書【2】に明記（従量課金なしの定額）	P.7・見積書
非機能要求③ HPは主管部署がメンテナンスすることを基本とする	○	主管部署ごとの更新権限+承認フローを構築し、ブロックエディタ・部署別マニュアル・操作研修で自力メンテを定着。さらに追加提案のAI支援（P.8）で下書き・チェックの負担を軽減	P.7・P.8
支援要求① 制作機能のチェックリスト提供 協会がチェックすべき事の明確化	○	工程ごとに検収用チェックリストを当社が作成・提供（機能・表示・権限・フォーム・リダイレクト）。協会がチェックすべき項目・手順・合否基準を明確化し、検収作業を最小負担に	P.9
支援要求② PMO活動への支援 進捗管理・リスク対策・活動計画の検証・ゲート判定評価+追加提案	○	週次進捗レポート・課題/リスク管理表・各ゲートの判定資料を当社が作成しPMOへ提供。追加提案として変更管理ルール（スコア変動の見える化）と予算消化の月次報告を運用します	P.9
支援要求③ PMO配置／PMO調達への参加意思表示	○	プロジェクト体制にPMO支援担当を配置します。別途のPMO調達についても参加の意思があります——本紙をもって意思表示いたします	P.9

提案の切り分け（提案書構成②） — 必須は「内数」で充足、追加提案は「分離」

提案必須 協会要求事項への対応

別ページ記載の要求事項（課題認識①～④・機能要求①～④・非機能要求①～③・支援要求①～③）に全項目○で対応（P.4～5）。すべて協会ご要求の内数で構成し、要求を満たさない項目はありません。

追加提案 当社判断で必要と考える事項

①AIによるHP更新支援（P.8・費用は見積書で分離・上限除外） ②変更管理・予算消化の月次報告（支援要求②への上乗せ・費用本体に内包）。範囲は必須作業の効果を高める所までに限定。

過不足なし

過少＝要求全項目に○対応で回避。過剰＝FAQ自動応答ボット等の大型AI機能は含めず、追加提案は分離・任意選択に限定。よって過剰実装はありません。

06 サイト構成（ターゲット別IA・9カテゴリ）

STRUCTURE

トップページを「目的別の入口」に特化。閲覧者は迷わず自分の入口を選び、最短で目的情報へ到達します。
詳細は別紙「サイトマップ（第4階層・全URL台帳つき）」をご参照ください。

本部サイト トップ（目的別ゲートウェイ）

資格を取りたい **主**
養成講座・講習・試験・資格更新

会員の方
会員サービス・手続き・**会員限定ログイン**

相談したい
電話/SNS相談・全国の相談室

企業・団体の方
研修・EAP・ストレスチェック

グローバルナビ（9カテゴリ・約100ページの内訳）

カテゴリ	想定	現行からの主な出元（実査済み）
01 相談・カウンセリング	約18P	/consultation/ ほか
02 資格・講座（メイン）	約38P	/course/ 21P+CMS外サブサイト（シニア特設・こころのアドバイザー・eラーニング）を統合
03 試験情報	約20P	/examination/ 11P
04 法人向けサービス	約16P	/group/ 15P（研修9ページをテーマ別に統合）
05 会員・入会案内	約22P	/admission/ 15P+マイページ+無料職業紹介
06 協会について	約28P	/about/ 10P+/adr/ 19P（→1ガイドに統合）ほか
07 ニュース／08 研究・刊行物／09 お問い合わせ	投稿型+約8P	記事400～600件を年度・種別で再分類／書籍・コラム・映像／フォーム集約

第4階層（記事詳細・年度別・全国13支部・16拠点[事務所・相談室]別 等）は**投稿タイプ+共通テンプレートで自動生成**し、固定ページの増殖と階層の深掘りを防止。サイト内検索はカテゴリ・タグ・年度・主管部署で絞り込めます。

資格取得者向けの強化（メイン）

資格の選び方チャート・講座比較・イベントカレンダーを新設。産業カウンセラー／キャリアコンサルタント／シニア等の違いを迷わず選べます。

時期ものは「ピックアップ枠」へ

講座募集・研究大会などの告知は**掲載期限つきバナー枠**で運用（部署申請→広報部承認→期限で自動非表示）。バナー乱立を仕組みで再発防止（機能要求②対応）。

07 基盤・CMS移行の方針（非機能要求対応）

PLATFORM

支部サイトで実績のある**Xサーバー+WordPress**を第一候補に、本部特有の要件の実現性を検証したうえで基盤を確定します（協会全体最適を最優先）。

WordPressへ移行する理由

- ・支部サイトと**基盤を統一**（運用ノウハウ・コスト最適化）
- ・職員が**自力で編集できる**（インフォCMSの高コスト・使いにくさを解消）
- ・**ライセンス料¥0**（オープンソース）で標準技術。人材確保・拡張性も安心

Xserver構成の欠点補完（機能強化提案）

- ・**WAF設定・ログイン保護**（不正アクセス対策）
- ・**自動バックアップ+復元手順の整備**
- ・**ステージング環境**で更新を事前確認
- ・プラグイン脆弱性の監視・月次アップデート

基盤選定の進め方（物販・会員限定ログインの実現性検証）



安全な移行（301リダイレクト設計）— 台帳は作成済み

- ✓ 静的155ページの全URL台帳（判定・行き先つき）を提案時点で作成済み——初日から移行設計に着手できます
- ✓ 現行URLは3規則が混在（実査で確認）。全パターンを対象に**旧URL→新URLの301リダイレクトマップ**を作成・実装・検証
- ✓ ニュース記事（約400～600件）・書籍データも全件台帳化し、年度・種別を付与して移行
- ✓ 公開後はGA4／Search Consoleで流入・エラーを監視し、取りこぼしを補正

保守・セキュリティ（保守/運用：要・ランニング提案）

- ・月次更新（本体・プラグイン）
- ・定期バックアップ+復元手順の整備
- ・障害の切り分け・復旧
- ・操作サポート（職員の運用支援）
- ・年次の脆弱性点検
- ・ステージングでの事前確認


情シス2名でも安全に運用できるよう、マニュアルと研修をあわせて提供します。費用は別紙見積書【2】（**定額・従量課金なし**）に明記しています。

08 追加提案 — AIで「更新し続けられる」HPへ

AI-POWERED OPERATION

革新的なのは見た目だけではありません。公開後のHP更新業務そのものをAIが支援します。AIが自動で公開するのではなく、下書き・チェック・分析を支援し、公開判断は必ず各部署の担当者が行います。

HP更新の5工程を、AIがこう支援します



全部署で使える

広報・養成・試験・総務・研究所など部署別のプロンプトとチェックリストを整備。部門ごとの運用差を抑え、品質を標準化します（機能要求①「自力作成」を後押し）。

安全な閉鎖領域で利用

一般公開のAIと異なり、貴会専用の閉鎖領域で利用。入力情報は領域外に出ず、AIの学習にも利用されない契約・設定。部署別アカウントと利用ログで管理します。

GA4×AIの月次診断

アクセスデータをAIが毎月診断し、「数値の羅列」ではなく「次に何をすべきか」まで整理してお届け（GA4が利用可能な場合）。

具体例 — こんな更新・分析ができます

更新（作成・修正）の例

- ・お知らせ／講座募集／イベント告知の下書き作成
- ・既存ページの文面リライト・長文の要約
- ・FAQの追記、専門用語のやさしい言い換え
- ・公開前のリンク・日付・掲載期限の点検


アクセス分析（GA4連携）の例

- ・月間アクセス上位／離脱の多いページの抽出
- ・検索キーワード・流入元の傾向
- ・問い合わせ・申込の増減サマリー
- ・「次に直すべきページ」の改善提案

貴会にとっての意味 — 「100ページを保ち続けられる」

ページを100に減らしても、運用が従来のみでは再び散らかります。AIが更新の負担を下げ、掲載期限付きの仕組みが放置を防ぐ——この2つで、少人数でも「見やすいサイト」を維持し続けられます。

安全な閉鎖領域のしくみ — 入力情報は外に出ず、AIの学習にも使われません

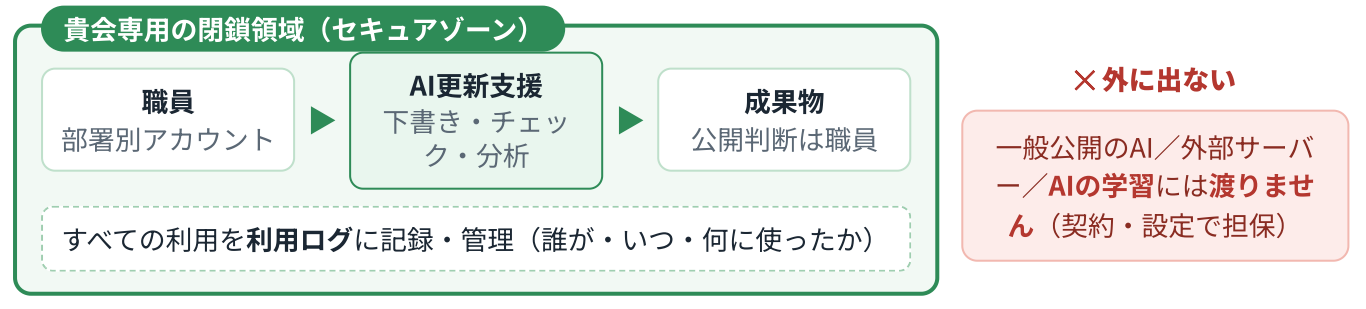

※ 本章はベンダー追加提案項目です（RFP提案書構成②）。費用は別紙見積書で提案必須費用と分離し、見積上限の除外対象として記載。範囲は「HP更新業務のAI活用」までに限定し（FAQ自動応答等は含みません）、過剰実装はありません。医療・心理に関わる表現はAIの提案をそのまま使わず、貴会の専門的判断を優先する運用とします。

09 実施体制・作業分担・スケジュール

TEAM & SCHEDULE


貴会（ご発注主・PMO事務局） ⇄ インフォネット＝窓口・進行管理・品質監修 ⇄ ITLINE＝設計・デザイン・構築・移行・AI導入

※ 貴会体制に整合：PMOベンダー（別調達）へ資料提供・基盤ベンダー（別調達）へ技術連携

作業分担 — ベンダー作業と協会作業（作業量の目安つき）

当社（ベンダー作業） 約8割		貴会 約2割
貴会の作業はレビュー・確認・検収が中心。定例（週1回程度）＋ピークは検収期の1～2週に集中し、日常運用はAI支援で軽量です。下表に工程別の協会側の作業量目安を明記しました。		
工程	ベンダー作業（当社）	協会作業（貴会）と作業量の目安
要件定義	ヒアリング設計・移行台帳の確定案・基盤検証・運用ルール案・チェックリスト整備	主管部署ヒアリング同席・台帳の確認判定 目安：週1回×1.5h＋資料確認
設計・デザイン	サイトマップ確定・ワイヤーフレーム・デザインカンパ（複数案）・スタイルガイド	各成果物のレビュー・案の選定 目安：レビュー会 隔週×1h
構築・移行	WordPress構築・全コンテンツ移行・301実装・AI実装（追加提案ご採用時）	原稿素材のご提供・移行内容の抜取確認 目安：週0.5～1h
検証・研修	総合テスト・検収用チェックリスト提供・マニュアル整備・操作研修の実施	チェックリストに沿った検収・研修参加（主管部署・情シス） 目安：検収1～2週＋研修2h×2回
公開・運用	DNS切替・公開後監視・月次保守・月次レポート	公開判断・通常の更新業務（AI支援あり）

スケジュール — 貴会プロジェクト日程・4ゲートに整合（契約開始 2026.8/24想定）

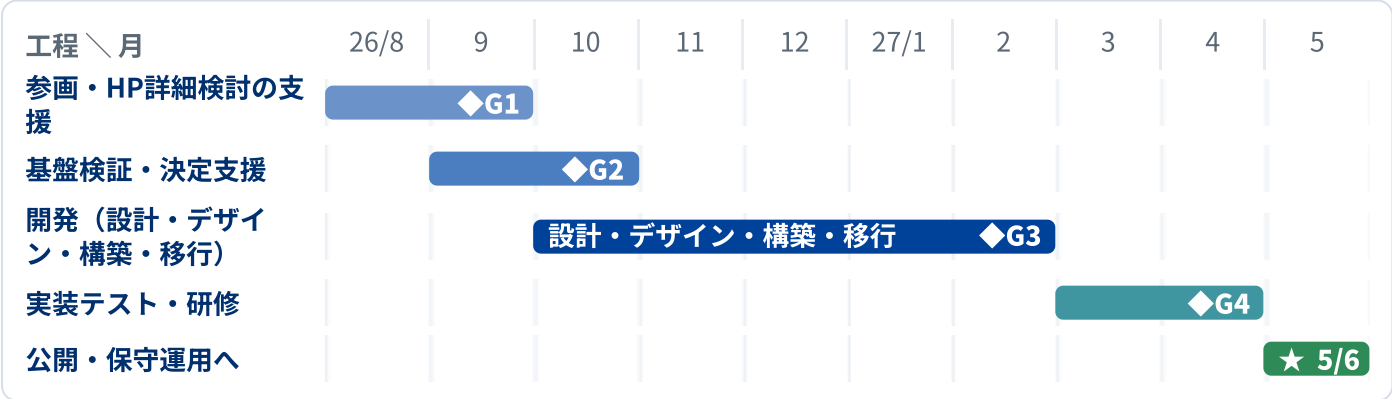

判定ゲート（RFP準拠・判定資料は当社が作成し貴会の意思決定を支援）：◆G1 実装範囲の決定（26.9）／◆G2 基盤の決定（26.10）／◆G3 開発終了（27.2）／◆G4 本稼働判定（27.4）／★公開 2027.5.6（木）・5月連休明け稼働。契約開始 2026.8/24想定。

PMO支援：週次進捗レポート・課題/リスク管理表・4ゲートの判定資料を当社が作成しPMOへ提供。別途のPMO調達にも参加意思があります。追加提案として変更管理・予算消化の月次報告も運用（支援要求①～③対応）。

10 デザイン方針／ご留意事項・まとめ

DESIGN & TERMS

デザイン方針 — 革新的に、しかし迷わせない（クリック可能なデモ制作済み）

ビジョンを訴求

「働く人と組織を心理で支える」姿勢をファーストビューで印象的に。組織トップのメッセージも時候で差し替え可能（機能要求②）。

ターゲット別に明快

資格取得者・会員・相談・法人が自分の入口を一目で選べる導線。見やすく・参照しやすく・操作しやすいUI。

誰にでも使える

スマホ最適化・文字サイズ・コントラストに配慮（JIS X 8341-3を参考）。幅広い年代の閲覧者に対応。

クリック可能な「リニューアル構成デモ」を制作済み——本提案のIA・導線・主要ページを**実際に動く全ページ試作**としてご用意しています。複数のデザイン方向性を検討のうえ推奨案に集約しました。**二次審査では実機（実際に動くデモ）をご提示**します。

概算お見積りについて

費用の詳細は別紙「概算見積書」にてご提出します（提出物②）。RFP見積書構成に沿って**提案必須の費用**（¥13,200,000・見積上限¥1,500万円の範囲内）と**追加提案の費用**（AI導入・上限除外）を分離し、初期費用／ランニング費用（従量課金なし）の内訳と**費用増大リスク・回避策**も明記しています。

ご留意事項

- ✓ 本提案の対象は本部サイト全体（**LPを含む全ページ**）です。支部サイトは対象外（既存基盤と整合して接続）。
- ✓ 基盤はXサーバー第一候補。物販・会員限定ログインの実現性を検証し、不足時はクラウド型を代替提案（費用差異は事前提示）。
- ✓ AI導入は追加提案項目（費用分離・上限除外）。範囲は「HP更新業務のAI活用」まで。
- ✓ 撮影・取材は含みません（不要のご指定）。ライティングは範囲確定後に別途ご相談（未定のご指定）。
- ✓ 工程別の契約形態・再委託の有無・SL要件、および会社概要（規模・体制・類似実績）は**別資料にてご提出**します。

本提案のまとめ — 選ばれる3つの理由

- ① **準備が済んでいる**：全ページ実査・155件の移行判定台帳・9カテゴリ設計・**クリック可能な全ページ試作（リニューアル構成デモ）**まで作成済みで、採択後すぐ走り出せます。
- ② **要求の内数で最適提案**：協会要求の全項目に対応（P.4～5）し、過剰実装は追加提案として分離・任意選択に。
- ③ **革新性が運用に効く**：AI更新支援×掲載期限の仕組みで、「約100ページの見やすいサイト」を公開後も維持し続けられます。
